

PROVINCIA AUTONOMA di TRENTO


Agenzia per la Depurazione
Ufficio Impianti di depurazione e collettori

PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DEL COLLETTORE PRINCIPALE DI FOGNATURA NERA VIGO LOMASO - PONTE ARCHE









LAYOUT SICUREZZA PLANIMETRIA 3f

IL COORDINATORE
Dott. Ing. Ivan Veronesi

Visto! IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Paolo Nardelli

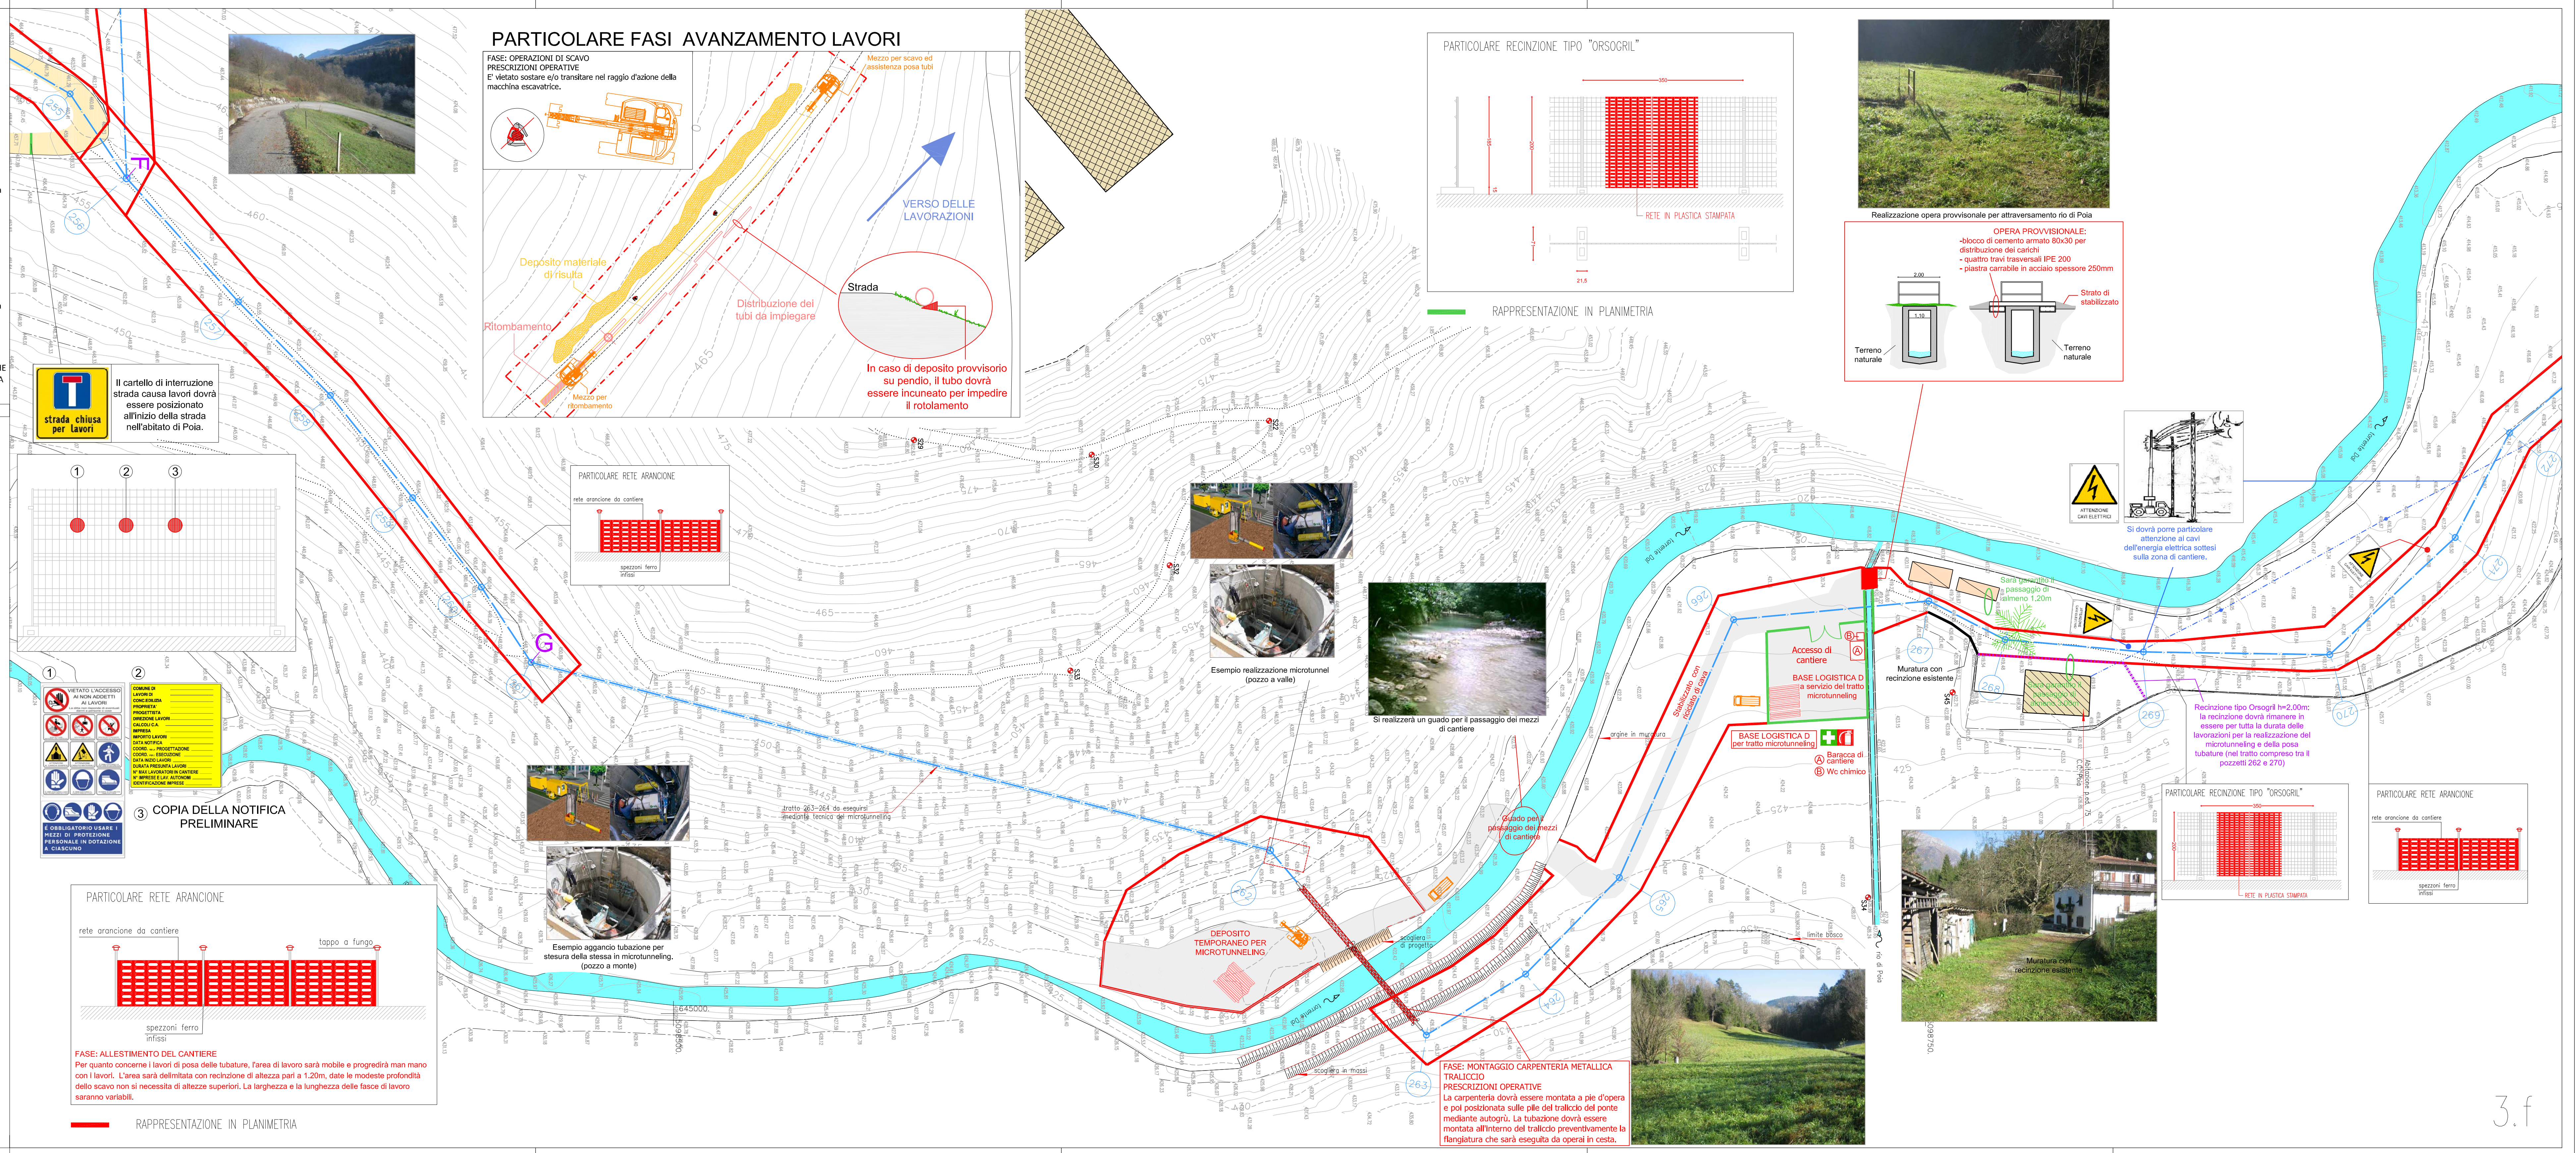

PARTICOLARE FASI AVANZAMENTO LAVORI

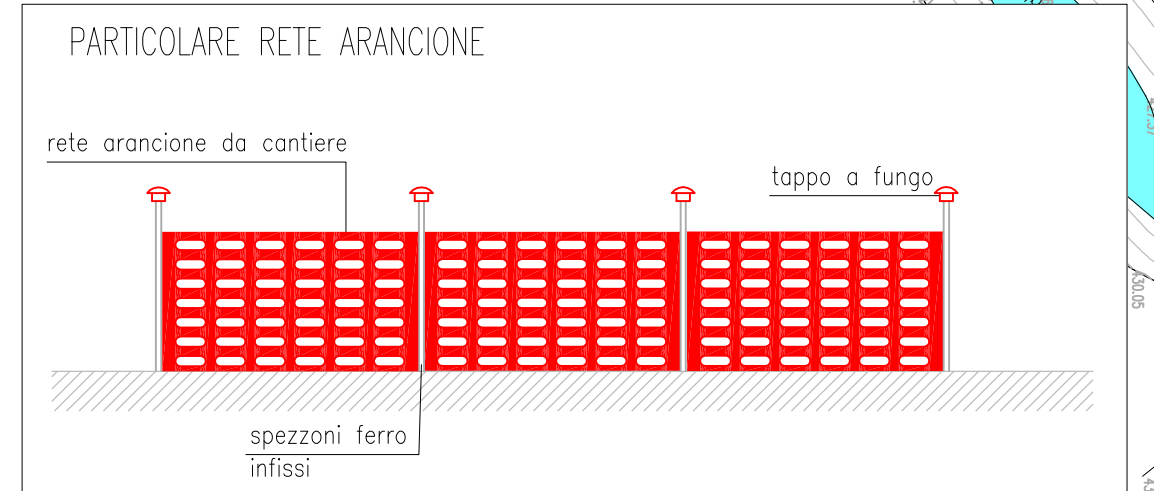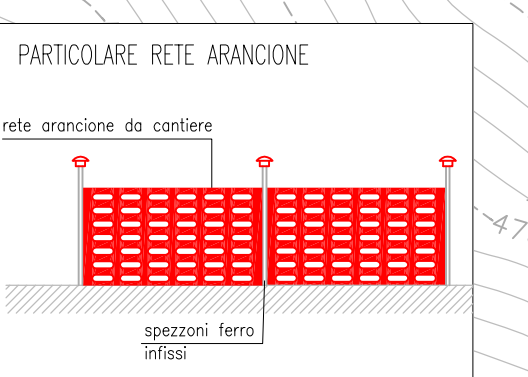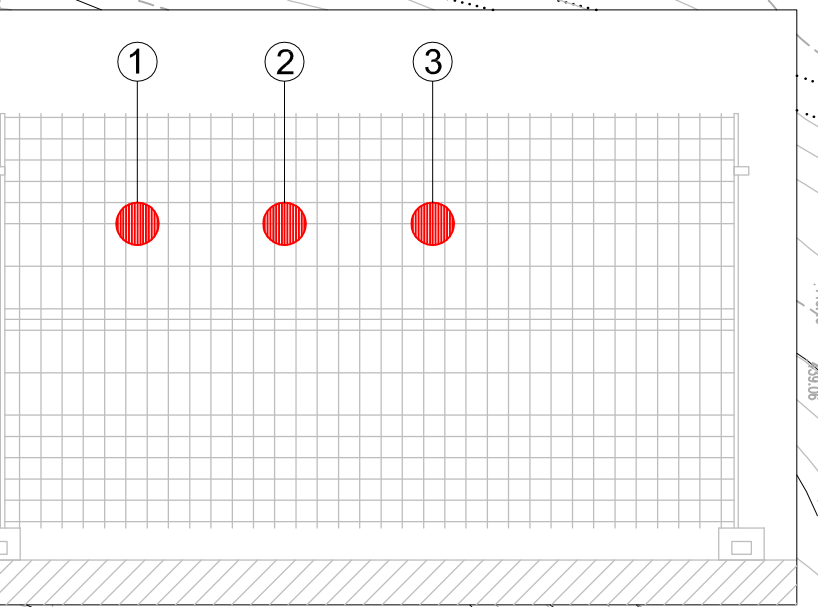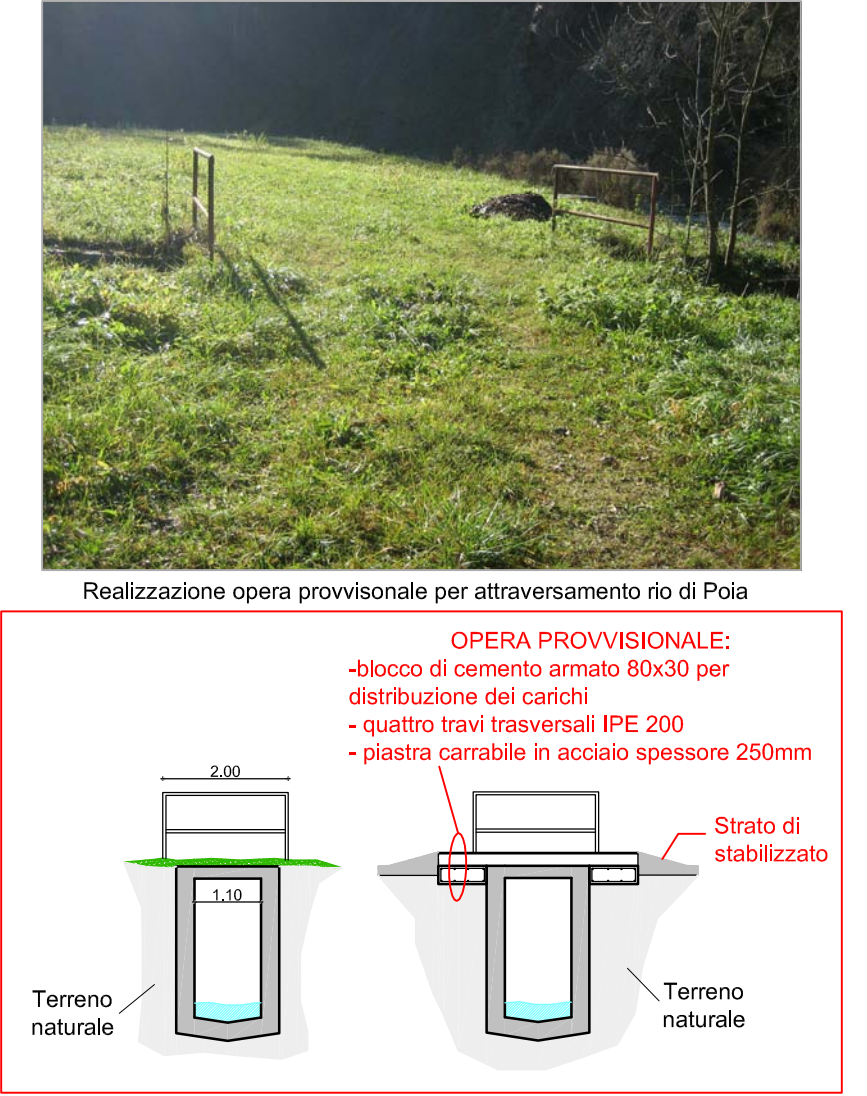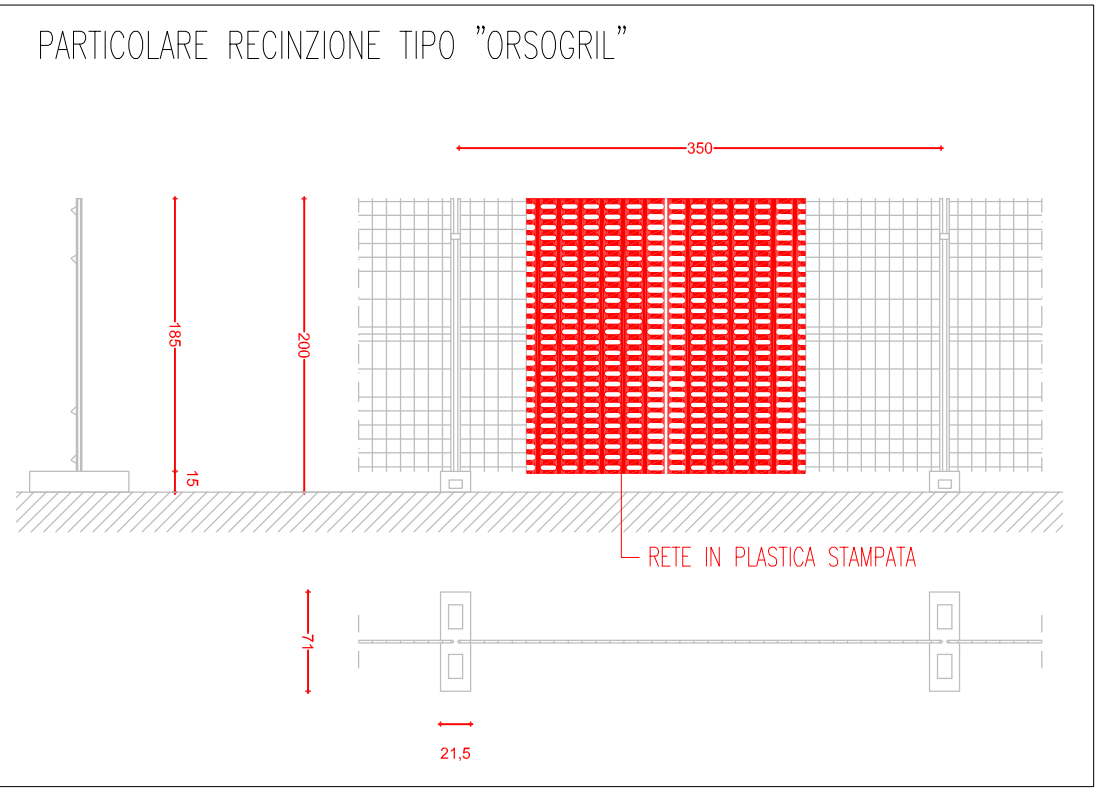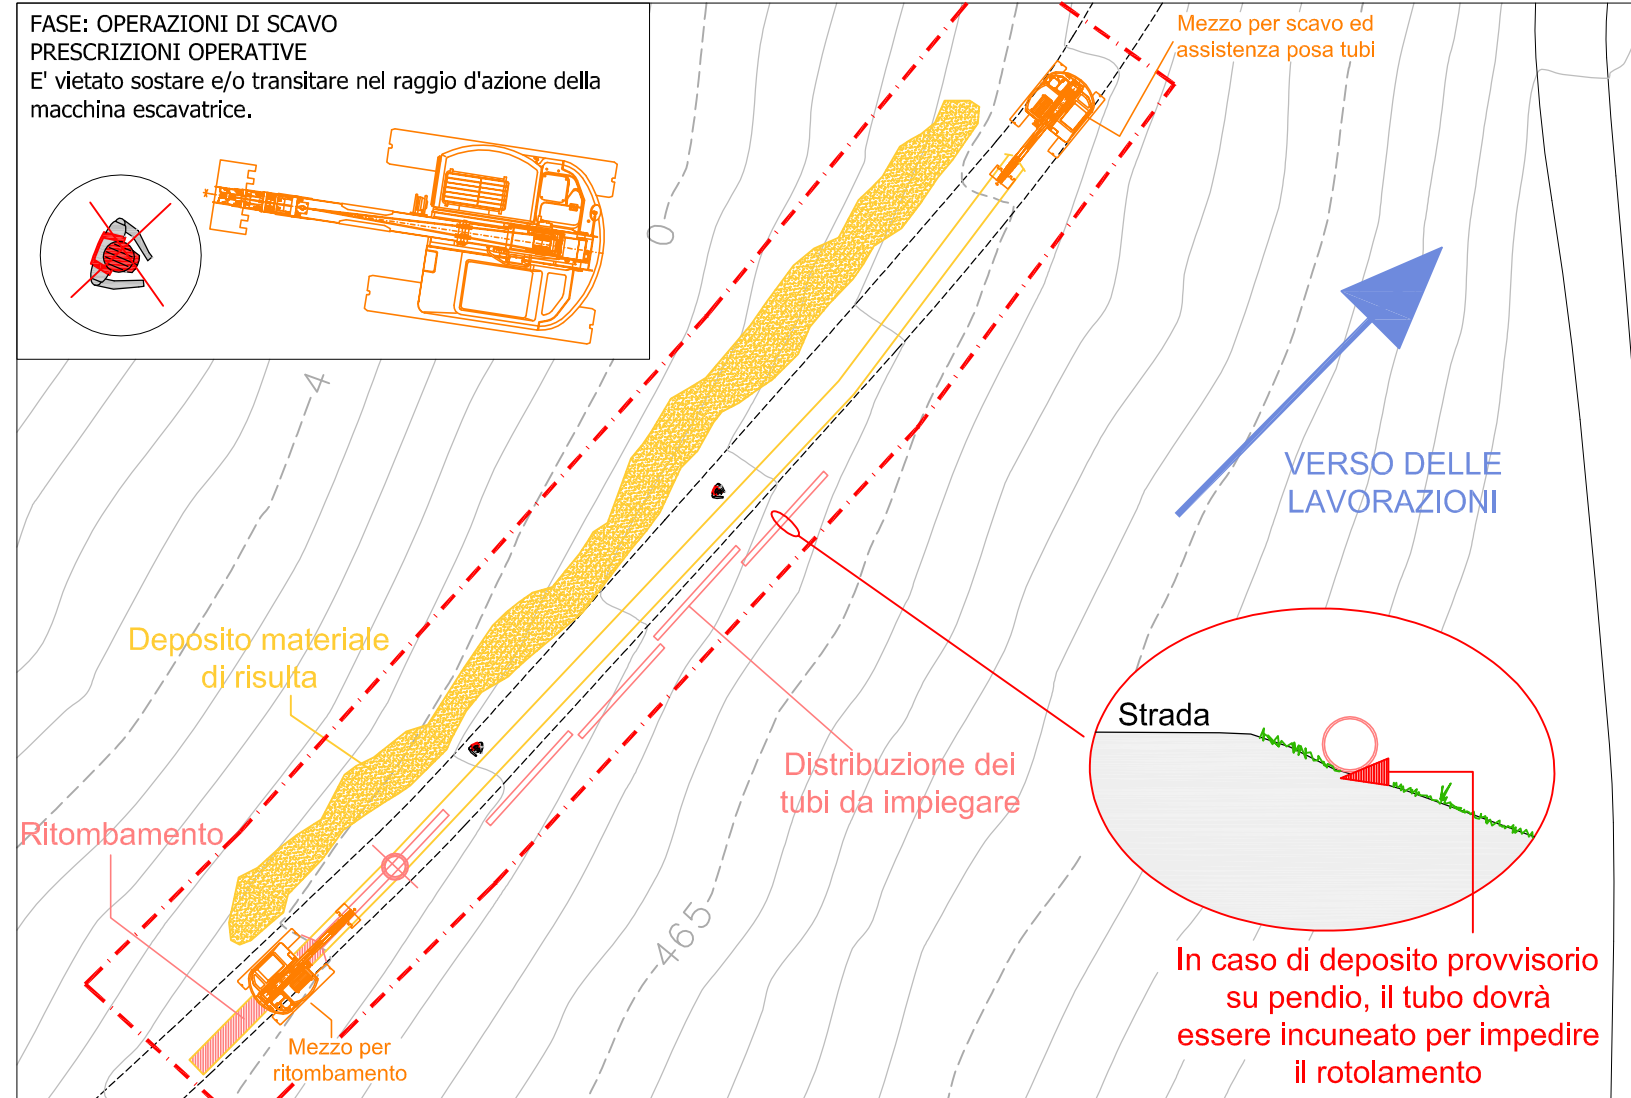

FASE: ALLESTIMENTO DEL CANTIERE
Per quanto concerne i lavori di posa delle tubature, l'area di lavoro sarà mobile e progredirà man mano con i lavori. L'area sarà delimitata con recinzione di altezza pari a 1,20m, dato le modestie profondità dello scavo non si necessita di altezze superiori. La larghezza e la lunghezza delle fasce di lavoro saranno variabili.

FASE: MONTAGGIO CARPENTERIA METALLICA TRALICCIO
PRESCRIZIONI OPERATIVE
La carpenteria dovrà essere montata a pie d'opera e poi posizionata sulle pile del traliccio del ponte mediante autogrù. La tubazione dovrà essere montata all'interno del traliccio preventivamente la flangiatura che sarà eseguita da operai in cesta.

